

# RENOUVELLEMENT DU VIADUC DE MARLY-LE-ROI

GROUPE DE SUIVI DU CHANTIER

JEUDI 26 JANVIER 2017



# DÉROULÉ DE LA RÉUNION

**1<sup>ère</sup> Partie :** Présentation du groupe de suivi

**2<sup>ème</sup> Partie :** Planning des travaux

+ Retour sur les travaux réalisés jusqu'ici

+ Les travaux à venir

**3<sup>ème</sup> Partie :** Temps d'échanges

# 1ÈRE PARTIE

# PRÉSENTATION DU GROUPE DE SUIVI



# LE GROUPE DE SUIVI DU CHANTIER

## OBJECTIF ET FONCTIONNEMENT



### Les objectifs du groupe de suivi :

- + **Inform**er le **public** de l'avancement du chantier
- + Et **recueillir les questions** du territoire en vue d'y **apporter des réponses**

### Le cadre de travail et fonctionnement :

- + Des règles de fonctionnement et un cadre de travail établis dans **une charte du groupe de suivi du chantier**
- + Des réunions régulières **tous les 2 ou 3 mois** en fonction de l'actualité du chantier

**LA PARTICIPATION AU GROUPE DE SUIVI DU CHANTIER IMPLIQUE D'AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE CETTE CHARTE ET D'ADHÉRER AUX PRINCIPES QU'ELLE ÉNONCE.**


# PRÉSENTATION DU GROUPE DE SUIVI

## LES MEMBRES

### Qui compose le groupe de suivi ?



**15 personnes** (riverains du viaduc, habitants de Marly, usagers de la ligne L)



Y compris des représentants :


- + du conseil de quartier
- + de l'association ARBABV

réparties en plusieurs collèges:

- + Riverains relogés pendant les périodes de sécurisation
- + Cité Blumenthal
- + Résidence des Vauillons
- + Avenue de l'Abreuvoir
- + Allée des Épinés
- + Quartier du Bois Martin
- + Habitants et / ou usagers

## 2ÈME PARTIE

# PLANNING DES TRAVAUX

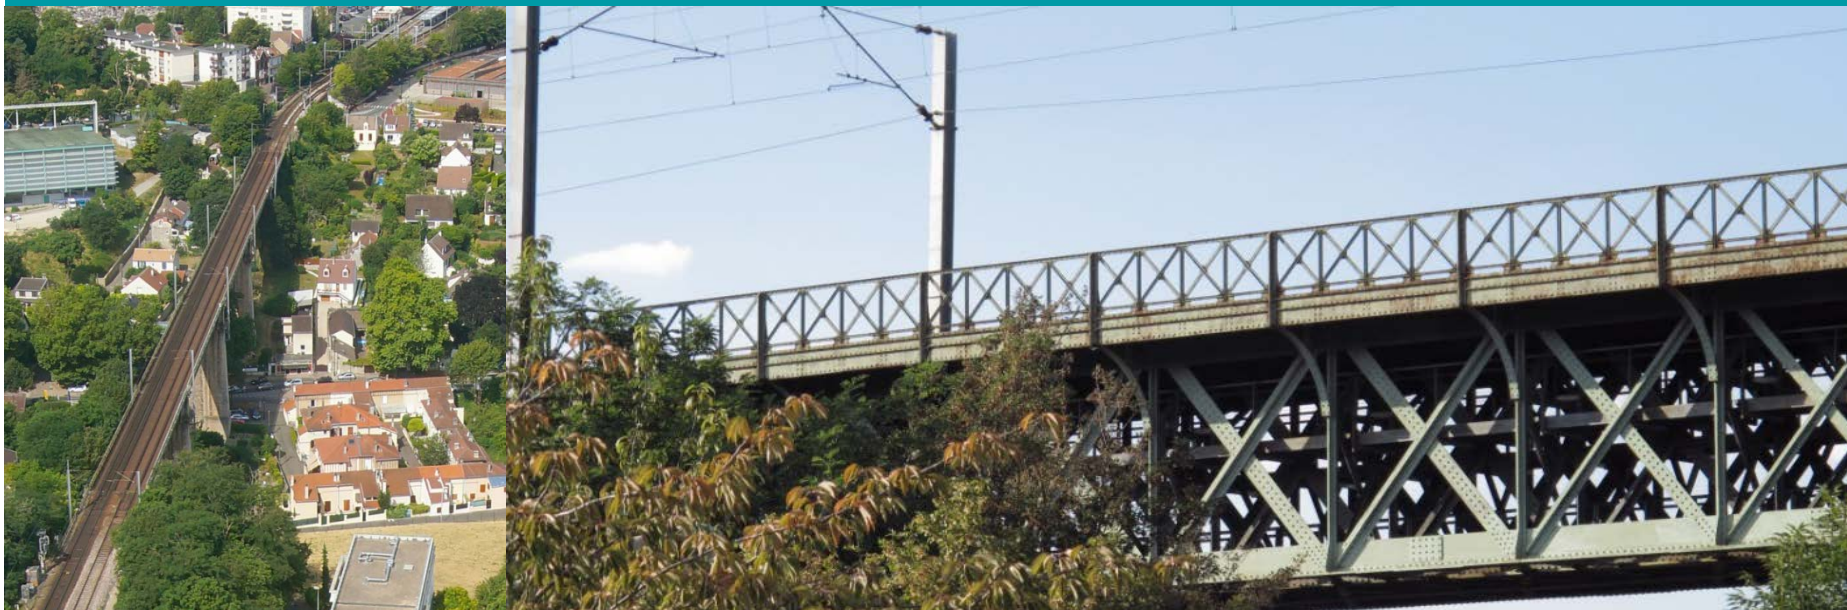

# PLANNING DES TRAVAUX (DÉMARRAGE DU CHANTIER)

Travaux réalisés

En cours

À venir



23/11/2016  
Début des travaux



# RETOUR SUR LES TRAVAUX RÉALISÉS

## Décembre :

- + Abattage des arbres (en journée)
- + Installation de la base vie

## Janvier :

- + Abattage des arbres (de nuit)
  - Travaux de nuit : seulement **3 nuits de travail sur les 4 prévues**
  - Information préalable réalisée : mail / tracts
- + Poursuite des travaux d'élagage / abattage d'arbres
- + Poursuite de l'installation de la base vie
- + Démarrage des aménagements rue de la Briqueterie (dévoisement des réseaux, passage couvert...)
- + Démarrage des travaux du cheminement





# LES TRAVAUX À VENIR

Dates Indicatives

**Février :**

- + **20/02** : cheminement piétonnier
- + **A partir du 6/02** : démolitions des pavillons
- + **A partir du 13/02** : mise en place de barrières de chantier acoustiques sous le viaduc
- + **Fin février** : préparation des pieux (terrassements)

**Mars :**

- + Démarrage des fondations des palées

**Avril :**

- + Poursuite des fondations
- + Construction de la berlinoise (C0) et confortement de l'appui fixe (C5) (travaux de nuit)

Vues 3D : du cheminement piétonnier



# ÉCHANGES



# PROCHAINE RENCONTRE

→ Printemps 2017



Les équipes SNCF Réseau restent à votre écoute pendant toute la durée du chantier par les points de contact fournis. Rappel des contacts :



Monsieur Sébastien GUELUY  
**06 19 56 25 36**  
Monsieur Sébastien STAELENS  
**06 19 78 47 01**



Mail : [viaducmarly@reseau.sncf.fr](mailto:viaducmarly@reseau.sncf.fr)  
Site internet : [www.renouvellement-viaduc-marly.fr](http://www.renouvellement-viaduc-marly.fr)

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
